

PRESIDENCIA MUNICIPAL MEXICO

Mpio. San Juan Tepehuala, Oax. 2020-2022

COMUNICACIONES

SINDICATO MUNICIPAL

Mpio. San Miguel Aloápam, Oax. 2021



ACTA CORRESPONDIENTE A LA ASAMBLEA REGIONAL DE LOS PUEBLOS ZAPOTECO Y CHINANTECO DE LA REGION SIERRA NORTE, PARA EVALUAR LOS AVANCES DEL PROGRAMA DE PAVIMENTACION DE CAMINOS A CABECERAS MUNICIPALES, Y ASI DEFINIR ESTRATEGIAS QUE PERMITAN CUMPLIR CON LAS METAS TRAZADAS PARA EL SIGUIENTE EJERCICIO FISCAL, EN SANTA MARIA YAVESIA, ESTADO DE OAXACA, 03 DE DICIEMBRE DEL 2021.

En el Municipio de Santa María Yavesía, Estado de Oaxaca, siendo las 13:00 (trece) horas del día 03 (tres) de diciembre del año 2021 (dos mil veintiuno); se reúnen en la explanada del Palacio Municipal las autoridades municipales de los siguientes municipios: Santiago Camotlán, C. Juan Pérez Morales, Presidente Municipal; Santa Catarina Lachatao, C. Blandino López Cano, Presidente Municipal; Santa María Temaxcalapa, C. Eusebio Morales Cano, Presidente Municipal; Santa María Yavesía, C. David Honorio Santiago Cruz, Presidente Municipal; San Juan Yaeé, C. Alejo Alfredo Sosa Hernández, Presidente Municipal; Santo Domingo Roayaga, C. Leonardo Víctor Martínez Morales, Presidente Municipal; Teococuilco de Marcos Pérez, C. Alfonso Tomas Pérez Ramírez, Presidente Municipal; Nuevo Zoquiápam, C. Ángel León Alavez, Presidente Municipal; Santa Ana Yareni, C. Juan Pedro Cruz Hernández, Presidente Municipal; San Miguel Abejones, C. Diego Cruz Bautista, Presidente Municipal; San Miguel Yotao, C. Pánfilo Mendoza Mendoza, Presidente Municipal; San Miguel Aloápam, C. Roberto Alavéz Hernández, Síndico Municipal; San Juan Petlapa, C. Joaquín Pura Estrada, Presidente Municipal; San Pedro Yaneri, C. Guillermo Ermitaño Pérez Prudencio, Presidente Municipal; San Juan Tabaá, C. Juan Miguel Fabián, Presidente Municipal; San Juan Yagila, Ixtlán de Juárez, C. Silvano Francisco Reyes, Agente Municipal; asimismo, se hace constar que se encuentran presentes: Por el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) Lic. Adelfo Regino Montes, Director General; Arq. Hugolino Mendoza Sánchez, Coordinador General de Infraestructura Indígena; Lic. Jerónimo López Marín, Titular de la Oficina de Representación en el Estado de Oaxaca, Lic. Cuauhtémoc Faustino Reyes, Titular del Centro Coordinador de los Pueblos Indígenas en Guelatao de Juárez; por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes Ing. José Daniel Ángeles Ramírez, Coordinador del Programa de Pavimentación de Caminos a Cabeceras Municipales del Centro SCT-Oaxaca, y la Ing. Saraí Barroso Bravo, residente de la SCT, en Ixtlán de Juárez, lo anterior, en términos de lo establecido por los artículos 1 y 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 2 fracción I, 3 fracción I y 45 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, y sus correlativos 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 11 fracciones II, IV y V, 17, 20 y 21 de la Ley del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas; con el objeto de llevar a cabo la ASAMBLEA REGIONAL PARA EVALUAR EL AVANCE DEL PROGRAMA DE PAVIMENTACION DE CAMINOS A CABECERAS MUNICIPALES, Y ASI PODER DEFINIR ESTRATEGIAS QUE PERMITAN CUMPLIR CON LAS METAS TRAZADAS PARA EL SIGUIENTE EJERCICIO FISCAL.

Se hace constar que, para ingresar a la sede oficial de la asamblea, se implementó un filtro sanitario con la finalidad de realizar el protocolo de sanidad correspondiente para la prevención de contagios del virus SARS-COV-2 (COVID-19). De esta manera, la presente reunión de trabajo se lleva a cabo, atendiendo las recomendaciones y medidas emitidas

PRESIDENCIA MUNICIPAL

Mpio. Nuevo Zoquiápam, Oax. 2020-2022

PRESIDENCIA MUNICIPAL

Mpio. Santa María Temaxcalapa, Oax. 2020-2022

PRESIDENCIA MUNICIPAL

Mpio. Santa Ana Yareni, Oax. 2020-2022

PRESIDENCIA MUNICIPAL

Mpio. San Miguel Yotao, Oax. 2020-2022

PRESIDENCIA MUNICIPAL

Mpio. Abejones, Oax. 2021-2022

PRESIDENCIA MUNICIPAL

Mpio. Santa Catarina Lachatao, Oax. 2021-2022

PRESIDENCIA MUNICIPAL

Mpio. Santo Domingo Roayaga, Oax. 2020-2022

PRESIDENCIA MUNICIPAL

Mpio. San Juan Tabaá, Oax. 2020-2022

PRESIDENCIA MUNICIPAL

Mpio. Santa María Yavesía, Oax. 2020-2022

PRESIDENCIA MUNICIPAL

Mpio. San Juan Yaeé, Oax. 2020-2022

PRESIDENCIA MUNICIPAL

Mpio. Santiago Camotlán, Oax. 2020-2022



GOBIERNO DE MEXICO
PRESIDENCIA MUNICIPAL
 Mpio. San Juan Petlapa
 Choapam, Oax.
 2020-2022

COMUNICACIONES INPI
 INSTITUTO NACIONAL DE LOS PUEBLOS INDIGENAS

SINDICATURA MUNICIPAL
 Mpio. San Miguel Aloapam
 Dto. Ixtlan, Oax.

PRESIDENCIA MUNICIPAL
 Mpio. San Pedro Yaneri
 Dto. Ixtlan, Oax.
 2021-2022

ACTA CORRESPONDIENTE A LA ASAMBLEA REGIONAL DE LOS PUEBLOS ZAPOTECO Y CHINANTECO DE LA REGION SIERRA NORTE, PARA EVALUAR LOS AVANCES DEL PROGRAMA DE PAVIMENTACION DE CAMINOS A CABECERAS MUNICIPALES, Y ASI DEFINIR ESTRATEGIAS QUE PERMITAN CUMPLIR CON LAS METAS TRAZADAS PARA EL SIGUIENTE EJERCICIO FISCAL, EN SANTA MARIA YAVESIA, ESTADO DE OAXACA, 03 DE DICIEMBRE DEL 2021.

PRESIDENCIA MUNICIPAL
 Mpio. Nuevo Zoquiapam,
 Dto. Ixtlan de Juarez,
 Oax. 2020-2022

por las autoridades de salud pública, en atención a la contingencia sanitaria actual, con el fin de salvaguardar la integridad física de los asistentes a la presente reunión de trabajo.

PRESIDENCIA MUNICIPAL
 Mpio. San Juan Tabaá,
 Dto. Villa Alta, Oax.
 2020-2022

De igual manera, se hace constar que siendo las 10:00 horas, se instalaron mesas para el registro de todos los asistentes, con la finalidad de dejar constancias documentadas de la asistencia de todas y cada una de las personas que acudieron a la presente asamblea, anexándose al término de este acto, en forma integral las respectivas listas de asistencia. Hecho lo anterior, se pasa al desahogo de la asamblea.

PRESIDENCIA MUNICIPAL
 Mpio. Santa María Temascalapa,
 Dto. Villa Alta, Oax.
 2020-2022

En primer término se pone a consideración de los presentes el orden del día:

PRESIDENCIA MUNICIPAL
 Mpio. Santa María Yavesía,
 Dto. Ixtlan, Oax.
 2020-2022

ORDEN DEL DIA

1. Registro de asistencia y presentación de Autoridades Municipales.
2. Ceremonia tradicional, a cargo de la C. Reynalda Santaella Martínez, Médica tradicional.
3. Palabras de bienvenida, por el C. David Honorio Santiago Cruz, Presidente Municipal de Santa María Yavesía.
4. Inauguración de la Asamblea, por el Lic. Adelfo Regino Montes, Director General del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas.
5. Información sobre los objetivos de la reunión y el método de trabajo, por el Arq. José Daniel Ángeles Ramírez, Coordinador del Programa de Pavimentación de Caminos a Cabeceras Municipales del Centro SCT-Oaxaca, y el Arq. Hugolino Mendoza Sánchez, Coordinador General de Infraestructura Indígena.
6. Presentación y evaluación de los avances en la construcción de los caminos de concreto, por las Autoridades Municipales, presentes.
7. Definición de acuerdos, estrategias y compromisos.
8. Firma del acta de acuerdos.
9. Clausura de la Asamblea, por el C. Leandro Santiago Martínez, Representante Comunal de Santa María Yavesía.

PRESIDENCIA MUNICIPAL
 Mpio. Santa Ana Yareni,
 Dto. Ixtlan, Oax.
 2020-2022

PRESIDENCIA MUNICIPAL
 Mpio. San Juan Yaeé,
 Dto. Villa Alta, Oax.
 2020-2022

Leído que fue el orden del día, se pone a consideración de los asistentes y se les pregunta si están de acuerdo con esta propuesta, a lo que contestaron que sí, no obstante, para dejar constancia se les pide que alcen la mano si están de acuerdo, por lo que alzando la mano lo aprobaron por unanimidad.

Se les consulta a los presentes si tiene algún otro punto que agregar, se hace constar que no se agregó Ningún asunto, en estas condiciones, se pasa de inmediato al desahogo de la asamblea conforme al orden del día aprobado.

PRESIDENCIA MUNICIPAL
 Mpio. San Miguel Yotaa,
 Dto. Ixtlan, Oax.
 2020-2022

PRESIDENCIA MUNICIPAL
 Mpio. Santa Catarina Lachidaa,
 Dto. Ixtlan, Oax.
 2021-2022

PRESIDENCIA MUNICIPAL
 Mpio. Santa Catarina Lachidaa,
 Dto. Ixtlan, Oax.
 2021-2022

PRESIDENCIA MUNICIPAL
 Mpio. Santa Dominga Noajaca,
 Dto. Villa Alta, Oax.
 2020-2022

PRESIDENCIA MUNICIPAL
 Mpio. Santiago Camaralán,
 Dto. Villa Alta, Oax.
 2020-2022



Gobierno de México
Presidencia Municipal
 Mpio. San Juan
 Petatepe
 Dto. Choapam, Oax.
 2020-2022

COMUNICACIONES INPI
Presidencia Municipal
 Mpio. Teocacuilho
 Marcos Pérez
 Dto. Ixtlán, Oax.
 2020-2022

Presidencia Municipal
 Mpio. San Miguel
 Aloapam
 Dto. Ixtlán, Oax.
 2020-2022

Presidencia Municipal
 Mpio. San Juan
 Dto. Villa de Juárez, Oax.
 2021-2022

Presidencia Municipal
 Mpio. Nuevo
 Zoquiapam,
 Dto. Ixtlán de Juárez,
 Oax. 2020-2022

Presidencia Municipal
 Mpio. Santa María
 Temascalapa,
 Dto. Villa Alta, Oax.
 2020-2022

Presidencia Municipal
 Mpio. Santa María
 Temascalapa,
 Dto. Villa Alta, Oax.
 2020-2022

Presidencia Municipal
 Mpio. Santa Ana
 Yareni,
 Dto. Ixtlán, Oax.
 2020-2022

Presidencia Municipal
 Mpio. Santa Ana
 Yareni,
 Dto. Ixtlán, Oax.
 2020-2022

Presidencia Municipal
 Mpio. Santa Ana
 Yareni,
 Dto. Ixtlán, Oax.
 2020-2022

Presidencia Municipal
 Mpio. San Miguel
 Yotao,
 Dto. Ixtlán, Oax.
 2020-2022

Presidencia Municipal
 Mpio. San Miguel
 Yotao,
 Dto. Ixtlán, Oax.
 2020-2022

Presidencia Municipal
 Mpio. Santa Catarina
 Lachatao,
 Dto. Ixtlán, Oax.
 2021-2022

ACTA CORRESPONDIENTE A LA ASAMBLEA REGIONAL DE LOS PUEBLOS ZAPOTECO Y CHINANTECO DE LA REGIÓN SIERRA NORTE, PARA EVALUAR LOS AVANCES DEL PROGRAMA DE PAVIMENTACIÓN DE CAMINOS A CABECERAS MUNICIPALES, Y ASÍ DEFINIR ESTRATEGIAS QUE PERMITAN CUMPLIR CON LAS METAS TRAZADAS PARA EL SIGUIENTE EJERCICIO FISCAL, EN SANTA MARÍA YAVESÍA, ESTADO DE OAXACA, 03 DE DICIEMBRE DEL 2021.

fuentes de empleo pues aquí hay mucha mano de obra y es por eso que son ellos quienes trabajan de manera activa. Por ello, a nombre del Presidente venimos a darles nuestro agradecimiento por el trabajo realizado, previamente estuvimos en San Jerónimo Taviche, donde se inauguró su camino. Por instrucciones del Presidente, Informa que se estarán realizando **11 Asambleas Regionales**, similares a esta, con el propósito de poder evaluar cómo se va desarrollando los trabajos de pavimentación y compartir las dificultades en estos trabajos, asimismo, poder prepararnos para el año 2022 y 2023, quiero decirles que se nos ha encomendado terminar estas obras en el mes de diciembre de 2023. Por ello, vamos a llevar la información, se está elaborando un acta. Siendo a la una de la tarde, aquí en esta serranía y en el municipio de Santa María Yavesía, declaro formalmente inaugurado esta asamblea Regional. Que tengamos una exitosa reunión.

5.- Información sobre los objetivos de la reunión y el método de trabajo, por el Ing. José Daniel Ángeles Ramírez, Coordinador del Programa de Pavimentación de Caminos a Cabeceras Municipales del Centro SCT-Oaxaca, y el Arq. Hugolino Mendoza Sánchez, Coordinador General de Infraestructura Indígena.

Hace uso de la palabra, el Ing. José Daniel Ángeles Ramírez, de la SCT, quien menciona, es un gusto estar con ustedes, reafirmarles que la dinámica de trabajo es la misma, en enero y febrero como centro SCT, deseamos ya terminar de formalizar los expedientes. Tenemos 60 caminos terminados más 32 por terminar. Es importante realizar los trabajos de conservación para garantizar su vida útil a 50 años. Tomaré nota de los planteamientos que harán ustedes en esta Asamblea.

En uso de la voz al Arq. Hugolino Mendoza Sánchez, del INPI, saluda a las autoridades de los pueblos presentes, quiero permitirme recordarles el objetivo de esta asamblea que es evaluar a la mitad del sexenio, el programa de pavimentación. Por lo que comparto la metodología que será la siguiente: van a participar las todas las autoridades, primero dirán el nombre del camino, los datos de sus avances físico financiero de los años 2019 a 2021. Finalmente, pedirles que compartan las problemáticas que han enfrentado y cuáles han sido las estrategias que usan para resolverlas, cómo ha sido la participación comunitaria en sus localidades, todo esto se estará asentando en un acta, junto con lo que nosotros podamos sugerir para mejorar nuestros trabajos.

6. - Presentación y evaluación de los avances en la construcción de los caminos de concreto, por las Autoridades Municipales presentes.

Presidencia Municipal
 Mpio. Santa Catarina
 Lachatao,
 Dto. Ixtlán, Oax.
 2021-2022

Presidencia Municipal
 Mpio. Santa Catarina
 Lachatao,
 Dto. Ixtlán, Oax.
 2021-2022

Presidencia Municipal
 Mpio. Santo Domingo
 Roayaga,
 Dto. Villa Alta, Oax.
 2020-2022

Presidencia Municipal
 Mpio. Santiago
 Camotlan,
 Dto. Villa Alta, Oax.
 2020-2022

GOBIERNO DE MÉXICO | COMUNICACIONES

ACTA CORRESPONDIENTE A LA ASAMBLEA REGIONAL DE LOS PUEBLOS ZAPOTECO Y CHINANTECO DE LA REGIÓN SIERRA NORTE, PARA EVALUAR LOS AVANCES DEL PROGRAMA DE PAVIMENTACIÓN DE CAMINOS A CABECERAS MUNICIPALES, Y ASÍ DEFINIR ESTRATEGIAS QUE PERMITAN CUMPLIR CON LAS METAS TRAZADAS PARA EL SIGUIENTE EJERCICIO FISCAL, EN SANTA MARÍA YAVESÍA, ESTADO DE OAXACA, 03 DE DICIEMBRE DEL 2021. -----

Toman participación los Presidentes Municipales, en el siguiente orden:-----

1. En uso de la palabra, el C. Juan Miguel Fabián, Presidente Municipal de **San Juan Tabaá**, realiza la presentación de la información relacionada con la construcción de los caminos de concreto en los términos siguientes: la longitud total del camino es de 7.30 km de los cuales, en el año 2021 realizan 3 km. En la obra sí existen dificultades, una de ellas fue por las constantes lluvias, lo que generó retraso de las metas, y la sugerencia es agilizar la firma de convenios con las nuevas autoridades para trabajar fuera de los tiempos de lluvia. El Director del INPI, hace la precisión que la meta para el año que sigue es de 4.3 km. -----
2. En uso de la palabra, el C. David Honorio Santiago Cruz, Presidente Municipal de **Santa María Yavesía**, realiza la presentación de la información relacionada con la construcción de su camino de concreto: menciona que la longitud total del camino es de 8 km de los cuales, en el año 2019 realizaron 1.50 km, en el año 2020 realizaron 4 km conforme a lo autorizado, en el año 2021 se autorizaron 2.50 km. De este modo, hemos alcanzado la meta. **Solo falta la señalización y dos puentes para el año 2022.** Problemáticas, hemos enfrentado lluvias, la alternativa fue modificar los horarios de labores, trabajando los días de calor, para que el material no se echara a perder, también la implementación de tequios comunitarios fue de gran importancia. -----
3. Toca el turno al C. Alejo Alfredo Sosa Hernández, Presidente Municipal de **San Juan Yaeé**, realiza la presentación de la información relacionada con la construcción de su camino: nuestra carretera se llama Km. 4.1 E. C. (TALEA DE CASTRO-SAN BARTOLOMÉ YATONI) SAN JUAN YAEÉ DEL KM 0+000 AL KM9+273., el ancho de corona es de 5 metros. la longitud total del camino es de 9 km de los cuales, en el año 2019 realizaron 2.3 km, en el año 2020 se autorizó y realizaron 2.3 km, en el año 2021 se realizan 2 km. Longitud pendiente es de 2.4 km. Hemos enfrentado problemas con los derrumbes, por lo que usamos la estrategia de no trabajar esos tramos en temporada de lluvias.-----
4. En uso de la palabra, el C. Juan Pérez Morales, Presidente Municipal de **Santiago Camotlán**, realiza la presentación de la información relacionada con la construcción de los caminos de concreto en los términos siguientes: la longitud total del camino es de 10.60 km de los cuales, en el año 2021 realizan 2.5 km. Nos falta 8.1 km para terminar hasta San Juan Yatzona. La problemática que enfrentamos fueron las lluvias en los meses de julio a septiembre, los materiales pétreos fue difícil el traslado de estos materiales por las lluvias y sufrimos un total desabasto, por ello, sugerimos que los recursos se nos ministren a principios de año. -----

PRESIDENCIA MUNICIPAL

Mpio. Nueva Zoquiapam, Dto. Ixtlán de Juárez, Oax. 2020-2022

PRESIDENCIA MUNICIPAL

Mpio. Santa María Temascalapa, Dto. Villa Alta, Oax. 2020 - 2022

PRESIDENCIA MUNICIPAL

Mpio. Santa Ana Yareni, Dto. Ixtlán, Oax. 2020 - 2022

PRESIDENCIA MUNICIPAL

Mpio. San Miguel Yotao, Dto. Ixtlán, Oax. 2020-2022

PRESIDENCIA MUNICIPAL

Mpio. San Juan Yavesía, Dto. Ixtlán, Oax. 2021 - 2022

PRESIDENCIA MUNICIPAL

Mpio. Santa Catarina Lachado, Dto. Ixtlán, Oax. 2021-2022

PRESIDENCIA MUNICIPAL

Mpio. Santo Domingo Roayaga, Dto. Villa Alta, Oax. 2020 - 2022

PRESIDENCIA MUNICIPAL

Mpio. San Juan Tabaá, Dto. Villa Alta, Oax. 2020-2022

PRESIDENCIA MUNICIPAL

Mpio. Santa María Yavesía, Dto. Ixtlán, Oax. 2020 - 2022

PRESIDENCIA MUNICIPAL

Mpio. San Juan Yaeé, Dto. Villa Alta, Oax. 2020 - 2022

PRESIDENCIA MUNICIPAL

Mpio. Santiago Camotlán, Dto. Villa Alta, Oax. 2020-2022

5



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
GOBIERNO DE MÉXICO
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 Mpio. Teacapulco de Marcos Pérez
 Dto. Ixtlán, Oax.
 2020-2022

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
COMUNICACIONES
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 Mpio. San Juan Petate
 Dto. Choapam, Oax.
 2020 - 2022

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
México 2021
 Año de la Independencia
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 Mpio. San Miguel Aloápam
 Dto. Ixtlán, Oax.

ACTA CORRESPONDIENTE A LA ASAMBLEA REGIONAL DE LOS PUEBLOS ZAPOTECO Y CHINANTECO DE LA REGIÓN SIERRA NORTE, PARA EVALUAR LOS AVANCES DEL PROGRAMA DE PAVIMENTACIÓN DE CAMINOS A CABECERAS MUNICIPALES, Y ASÍ DEFINIR ESTRATEGIAS QUE PERMITAN CUMPLIR CON LAS METAS TRAZADAS PARA EL SIGUIENTE EJERCICIO FISCAL, EN SANTA MARÍA YAVESÍA, ESTADO DE OAXACA, 03 DE DICIEMBRE DEL 2021. -----

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
AGENCIA MUNICIPAL
 Mpio. Ixtlán de Juárez
 Dto. Ixtlán, Oax.
 2020-2022

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PRESIDENCIA MUNICIPAL
 Mpio. Santa María Temaxcalapa,
 Dto. Villa Alta, Oax.
 2020 - 2022

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PRESIDENCIA MUNICIPAL
 Mpio. Santa Ana Yareni,
 Dto. Ixtlán, Oax.
 2020 - 2022

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PRESIDENCIA MUNICIPAL
 Mpio. San Miguel Yotao,
 Dto. Ixtlán, Oax.
 2020-2022

5. Toma la palabra, el C. Ángel León Alavés, Presidente Municipal de **Nuevo Zoquiápam**, da las gracias al Gobierno Federal por el apoyo: la longitud total del camino es de 10.70 km de los cuales, en el año 2020 realizaron 6 km, en el año 2021 realizaron 4.70 km. Hemos terminado nuestro camino, la semana pasada se realizó la señalización del mismo y acordaron reparar los tramos con asentamientos. -----

6. En uso de la palabra, el C. Abisai Arreola Velasco, Secretario Municipal de **Santa María Temaxcalapa**, realiza la presentación de la información relacionada con la construcción de los caminos de concreto en los términos siguientes: Saluda a todos los presentes y funcionarios presentes, la longitud total del camino es de 11.29 km de los cuales, ancho de corona de 6 m. en el año 2019 realizaron 7 km, en el año 2021 realizan 4.29 km. Hasta el momento llevamos 3.3 km. Falta 1 km. Que pretendemos terminar este mes de diciembre. Problemáticas, hay una falla geológica del kilómetro 0+540 al 0+640, la cual, no se encuentra pavimentada y también hay deslaves constantes, del km 2+820 al km 2+940, mismos que no se trabajaron por recomendación de la SCT. Una alternativa que compartimos es hacer un buen trabajo de terracerías para poder hacer en mejores condiciones los caminos pavimentados. Por la parte de contraloría, sentimos que hace falta mayor capacitación hacia nosotros por parte de las instituciones. -----

7. En uso de la palabra, el C. Juan Pedro Cruz Hernández, Presidente Municipal de **Santa Ana Yareni**, realiza la presentación de la información respecto a la construcción de su camino, damos gracias al licenciado Andrés Manuel López Obrador, por este apoyo que era un sueño para nosotros. la longitud total del camino es de 12 km de los cuales, el ancho de corona es de 6 metros. En el año 2020 realizaron 4.5 km, en el año 2021 realizan 4.50 km. Problemáticas, enfrentamos derrumbes a lo largo del tramo, Estrategia para el año 2022, ganarle a la temporada de lluvia iniciando los trabajos de ampliación de los tramos a pavimentar, la longitud pendiente para entroncar con el camino de San Miguel Aloapam es de 3.5 km. En el km 8+700, hay una falla geológica, pero ya se está trabajando nos faltan 100 metros para terminar-----

8. En uso de la palabra, el C. Pánfilo Mendoza, Presidente Municipal de **San Miguel Yotao**, realiza la presentación de la información relacionada con la construcción de su camino de concreto: Después de saludar, menciona que han enfrentado temporada de lluvias y todos sabemos que eso genera retraso en el trabajo; también, faltan ampliaciones en algunos tramos; otra dificultad es con los camiones que suministran materiales. Acciones para resolver estas problemáticas, estamos trabajando con rotomartillos, y explosivos, la longitud total del camino es de 13 km de los cuales, en el año 2020 realizaron 1.35 km, en el

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PRESIDENCIA MUNICIPAL
 Mpio. Abasco,
 Dto. Ixtlán, Oax.
 2021 - 2022

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PRESIDENCIA MUNICIPAL
 Mpio. Santa Catarina Coahatán,
 Dto. Ixtlán, Oax.
 2021-2022

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PRESIDENCIA MUNICIPAL
 Mpio. Santa Dominga Roayaga,
 Dto. Villa Alta, Oax.
 2020 - 2022

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PRESIDENCIA MUNICIPAL
 Mpio. San Juan Tabá,
 Dto. Villa Alta, Oax.
 2020 - 2022

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PRESIDENCIA MUNICIPAL
 Mpio. Santa María Yavesía,
 Dto. Ixtlán, Oax.
 2020 - 2022

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PRESIDENCIA MUNICIPAL
 Mpio. San Juan Yaré,
 Dto. Villa Alta, Oax.
 2020 - 2022

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PRESIDENCIA MUNICIPAL
 Mpio. Santiago Camotlán,
 Dto. Villa Alta, Oax.
 2020-2022

GOBIERNO DE
PRESIDENCIA MUNICIPAL

COMUNICACIONES

INPL
SINDICATURA MUNICIPAL



Mpio. San Juan
Pochteca
Dtto. Choapam, Oax.
2020 - 2022

Mpio. Teococuilco
de Marcos Pérez
Dtto. Ixtlán, Oax.

"SAN JUAN YAGILA"
Mpio. Ixtlán de
Juarez.

Mpio. San Miguel
Aloápam
Dtto. Ixtlán, Oax.

Mpio. San Juan
Tababá
Dtto. Villa Alta, Oax.
2021 - 2022

ACTA CORRESPONDIENTE A LA ASAMBLEA REGIONAL DE LOS PUEBLOS ZAPOTECO Y CHINANTECO DE LA REGIÓN SIERRA NORTE, PARA EVALUAR LOS AVANCES DEL PROGRAMA DE PAVIMENTACIÓN DE CAMINOS A CABECERAS MUNICIPALES, Y ASÍ DEFINIR ESTRATEGIAS QUE PERMITAN CUMPLIR CON LAS METAS TRAZADAS PARA EL SIGUIENTE EJERCICIO FISCAL, EN SANTA MARÍA YAVESÍA, ESTADO DE OAXACA, 03 DE DICIEMBRE DEL 2021. -----

año 2021 realizan 1.50 km. La longitud pendiente por pavimentar es de 10.15 Km. Para el próximo año se estima trabajar una meta de 5 km y el resto en el 2023 a fin de que puedan cumplir su meta. -----

9. En uso de la palabra, el C. Leonardo Víctor Martínez Morales, Presidente Municipal de **Santo Domingo Roayaga**, realiza la presentación de la información relacionada con la construcción del camino, menciona que fueron cortes muy altos, han trabajado la ampliación. Cede la palabra al supervisor de la obra, informa que la longitud total del camino a pavimentar es de 13.89 km de los cuales, en el año 2019 realizaron 2 km, en el año 2020 realizaron 5.6 km, en el año 2021 realizaron 4.790 km, en este ejercicio vamos a tener 12.39 km de avance. Hace falta 1.5 km para alcanzar la meta final. Problemas, uno fue el factor clima, como todos ya lo han mencionado, también la escasez de piedra, que resolvimos explotando un banco de este material en nuestra comunidad, acciones de solución, incrementamos personal, tuvimos diálogo con autoridades de Villa Alta, la participación comunitaria ha sido muy importante. Compartimos la idea de firmar convenios a tiempo y se ministren los recursos de manera ágil. -----
10. En uso de la palabra, el C. Blandino López Cano, Presidente Municipal de **Santa Catarina Lachatao**, realiza la presentación de la información relacionada con la construcción de los caminos de concreto en los términos siguientes: la longitud total del camino es de 16 km de los cuales, en el año 2021 autorizaron 4 km. Próximos a concluir, en el km 5 hay un puente ancestral, se piensa modernizar. El técnico de la obra, también informa que el costo, consideran que es bajo pues 200 pesos no alcanzan, solicitan que se reconsidere este monto. -----
11. Participación del Presidente Municipal de **San Juan Chicomezuchil**, solicita que se respete el puente histórico por donde pasó el Licenciado Benito Juárez y se construya uno nuevo. -----
12. En uso de la palabra, el C. Diego Cruz Bautista, Presidente Municipal **San Miguel Abejones**, realiza la presentación de la información relacionada con la construcción de los caminos de concreto en los términos siguientes: la longitud total del camino es de 17.40 km de los cuales, en el año 2020 realizaron 4. km, en el año 2021 realizan 3.5 km. En este año, se aprobó una ampliación de 2 km, que están en proceso, llevamos un avance de 1.7 km. Para terminar la meta final nos falta 9 km. Problemáticas, enfrentamos la temporada de lluvias, deslaves, derrumbes. Para el 2022, estimamos que nos autoricen 7.86 km. Para terminar hasta San Juan Atepec. -----
13. En uso de la palabra, el C. Pedro Santiago Cruz, Secretario Municipal de **San Miguel Aloápam**, realiza la presentación de la información relacionada con la construcción de los caminos de concreto en los términos siguientes: la longitud

PRESIDENCIA MUNICIPAL
Mpio. Nuevo Zoquiapam,
Dtto. Ixtlán de Juarez,
Oax. 2020-2022

PRESIDENCIA MUNICIPAL
Mpio. Santa María Temascalapa,
Dtto. Villa Alta, Oax.
2020 - 2022

PRESIDENCIA MUNICIPAL
Mpio. Santa Ana Yareni,
Dtto. Ixtlán, Oax.
2020 - 2022

PRESIDENCIA MUNICIPAL
Mpio. San Miguel Yotao,
Dtto. Ixtlán, Oax
2020-2022

PRESIDENCIA MUNICIPAL
Mpio. Abejones,
Dtto. Ixtlán, Oax.
2021-2022

PRESIDENCIA MUNICIPAL
Mpio. Santa Catarina Lachatao,
Dtto. Ixtlán, Oax.
2021-2022

PRESIDENCIA MUNICIPAL
Mpio. Santo Domingo Roayaga,
Dtto. Villa Alta, Oax.
2020 - 2022

PRESIDENCIA MUNICIPAL
Mpio. Santiago Camotlán,
Dtto. Villa Alta, Oax.
2020-2022

PRESIDENCIA MUNICIPAL
Mpio. San Juan Tababá,
Dtto. Villa Alta, Oax.
2020 - 2022

PRESIDENCIA MUNICIPAL
Mpio. Santa María Yavesía,
Dtto. Ixtlán, Oax.
2021-2022

PRESIDENCIA MUNICIPAL
Mpio. San Juan Yacé,
Dtto. Villa Alta, Oax.
2020 - 2022

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
GOBIERNO DE MEXICO

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
COMUNICACIONES

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
INPI SINDICATURA MUNICIPAL



Mpio. San Juan Petlapa
Dpto. Chiapas, Oax.
2020-2022

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PRESIDENCIA MUNICIPAL
Mpio. Teococuilco de Marcos Pérez

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PRESIDENCIA MUNICIPAL
"SAN JUAN YAGILA"
Mpio. Ixtlán de Juárez

Mpio. San Miguel Aloápam
Dpto. Ixtlán Oax

ACTA CORRESPONDIENTE A LA ASAMBLEA REGIONAL DE LOS PUEBLOS ZAPOTECO Y CHINANTECO DE LA REGIÓN SIERRA NORTE, PARA EVALUAR LOS AVANCES DEL PROGRAMA DE PAVIMENTACIÓN DE CAMINOS A CABECERAS MUNICIPALES, Y ASÍ DEFINIR ESTRATEGIAS QUE PERMITAN CUMPLIR CON LAS METAS TRAZADAS PARA EL SIGUIENTE EJERCICIO FISCAL, EN SANTA MARÍA YAVESÍA, ESTADO DE OAXACA, 03 DE DICIEMBRE DEL 2021. -----

total del camino es de 18 km de los cuales, con 6 metros de ancho de corona. En el año 2020 realizaron 5 km, en el año 2021 realizan 7 km. De los cuales se llevan 6.3 km. Hacen falta 700 metros para terminar esta fase. Nosotros no tuvimos problemas con las lluvias, tenemos un problema con San Juan del Estado, con los que hemos dialogado, se tuvo dos derrumbes, que se resolvieron con maquinaria propia de la comunidad, hemos empleado tequios para avanzar. En estas actividades, la comunidad de San Juan del Estado, nos giro por escrito un oficio, donde nos quieren multar con un millón de pesos. De lo contrario paran la obra. -

14. En uso de la palabra, el C. Alfonso Tomas Pérez Ramírez, Presidente Municipal de **Teococuilco de Marcos Pérez**, realiza la presentación de la información relacionada con la construcción de los caminos de concreto, envía su agradecimiento al Presidente de la República, por el apoyo. la longitud total del camino es de 37.56 km de los cuales, en el año 2020 realizaron 5.62 km, en el año 2021 realizaron 7 km. La meta 2022 es hacer 14 km con nuestra comunidad. Coincidimos con los planteamientos que han hecho las comunidades que antecedieron en uso de la palabra. También, nos hemos comprometido a ampliar nuestro camino, nos quedan 28.88 km para alcanzar la meta final. -----

15. En uso de la palabra, el C. Joaquín Pura Estrada, Presidente Municipal de **San Juan Petlapa**, realiza la presentación de la información relacionada con la construcción de los caminos de concreto en los términos siguientes: nosotros empezamos cuando inicio la pandemia, la longitud total del camino es de 43 km de los cuales, con 4.5 metros el ancho de corona. En el año 2020 realizaron 2.25 km, en el año 2021 realizan 2 km. Problemática, las comunidades vecinas, nos cierran el paso impidiendo mover los materiales para la obra, la propuesta que tenemos es que, si Temaxcalapa y Roallaga van a tener su camino, que ellos puedan trabajar el tramo de Temaxcalapa a Yalahui, sería un frente y de Petlapa para Yalahui, sería otro frente. 38.25 km es la longitud pendiente por pavimentar. -----

16. En uso de la palabra, el C. Guillermo Ermitaño Pérez Prudencio, Presidente Municipal de **San Pedro Yaneri**, realiza la presentación de la información relacionada con la construcción de los caminos de concreto, expone que la longitud total del camino es de 43 km de los cuales, 5 metros de ancho de corona. En el año 2020 realizaron 4.26 km, en el año 2021 realizan 4.50 km. Hemos enfrentado lluvias como todos han mencionado aquí, la maquinaria ha tenido fallas mecánicas, también cambios en autoridades municipales, que dificultan la continuidad de la obra. Hacen falta 34 km para alcanzar la meta. -----

17. En uso de la palabra, el C. Silvano Francisco Reyes, Agente Municipal de **San Juan Yagila**, Ixtlán de Juárez, realiza la presentación de la información relacionada con la construcción de los caminos de concreto en los términos siguientes: la longitud

Mpio. Nuevo Zequiapam,
Dpto. Ixtlán de Juárez,
Oax. 2020-2022

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PRESIDENCIA MUNICIPAL
Mpio. Santa María Temaxcalapa,
Dpto. Villa Alta, Oax.
2020-2022

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PRESIDENCIA MUNICIPAL
Mpio. Santa Ana Yareni,
Dpto. Ixtlán, Oax.
2020-2022

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PRESIDENCIA MUNICIPAL
Mpio. San Miguel Yotaa,
Dpto. Ixtlán, Oax.
2020-2022

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PRESIDENCIA MUNICIPAL
Mpio. Ixtlán, Oax.
2021-2022

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PRESIDENCIA MUNICIPAL
Mpio. Santa Catarina Lachatao,
Dpto. Ixtlán, Oax.
2021-2022

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PRESIDENCIA MUNICIPAL
Mpio. Santo Domingo Roayaga,
Dpto. Villa Alta, Oax.
2020-2022

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PRESIDENCIA MUNICIPAL
Mpio. San Juan Tabaa,
Dpto. Villa Alta, Oax.
2020-2022

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PRESIDENCIA MUNICIPAL
Mpio. Santa María Yavesía,
Dpto. Ixtlán, Oax.
2020-2022

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PRESIDENCIA MUNICIPAL
Mpio. San Juan Yaaé,
Dpto. Villa Alta, Oax.
2020-2022

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PRESIDENCIA MUNICIPAL
Mpio. San Juan Yaaé,
Dpto. Villa Alta, Oax.
2020-2022

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PRESIDENCIA MUNICIPAL
Mpio. Santiago Camotlán,
Dpto. Villa Alta, Oax.
2020-2022

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PRESIDENCIA MUNICIPAL
Mpio. Santiago Camotlán,
Dpto. Villa Alta, Oax.
2020-2022

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
GOBIERNO DE OAXACA
COMUNICACIONES INPI
PRESIDENCIA MUNICIPAL SINDICATURA MUNICIPAL

ACTA CORRESPONDIENTE A LA ASAMBLEA REGIONAL DE LOS PUEBLOS ZAPOTECO Y CHINANTECO DE LA REGION SIERRA NORTE, PARA EVALUAR LOS AVANCES DEL PROGRAMA DE PAVIMENTACION DE CAMINOS A CABECERAS MUNICIPALES, Y ASI DEFINIR ESTRATEGIAS QUE PERMITAN CUMPLIR CON LAS METAS TRAZADAS PARA EL SIGUIENTE EJERCICIO FISCAL, EN SANTA MARIA YAVESIA, ESTADO DE OAXACA, 03 DE DICIEMBRE DEL 2021. -----

total del camino es de 65 km de los cuales, ancho de corona 6 metros, en el año 2021 realizan 3 km. Enfrentamos problemas como la lluvia, somos 7 comunidades, y es difícil ponernos de acuerdo, tenemos la propuesta que cada comunidad implemente un frente de trabajo, de este modo podremos avanzar el próximo año. -----

Con lo anterior se tiene por desahogado este punto del orden del día.-----

7. Definición de acuerdos, estrategias y compromisos.- Tomando en cuenta las manifestaciones vertidas en el punto inmediato anterior, los asistentes a la presente reunión de trabajo, de forma libre y voluntaria, formalizan los siguientes:-----

ACUERDOS-----

Primero: Abrir tres frentes de trabajo para el camino de San Juan Petlapa. El primero a cargo de San Juan Petlapa; el segundo por San Juan Yalahui, y el tercero por Santa María Temascalapa. Previa reunión de trabajo entre las tres comunidades en donde se acordarán las metas y la forma de trabajo para los ejercicios fiscales 2022-2023, con previa autorización de sus respectivas asambleas Generales. -----

Segundo: Abrir dos frentes de trabajo en el camino de San Pedro Yaneri, uno de este Municipio y el otro con la comunidad de San Juan Tepanzacoalco, de igual forma, con previa reunión de trabajo de las autoridades comunitarias en donde se definirán los tramos a ejecutar, con autorización de sus Asambleas Generales.-----

Tercero: Abrir 4 frentes de trabajo para avanzar en el camino de San Juan Yagila, en las siguientes comunidades (**San Juan Yagila, Santiago Teotlasco, Santa Cruz Yagavila y Santa María Zogochi**), con la posibilidad de que el resto de comunidades (**La Luz, Tiltepec y Santa María Josaa**), puedan apoyar, previa reunión de trabajo de las autoridades comunitarias en donde se definirán los tramos a ejecutar, con autorización de sus asambleas generales.-----

Cuarto: Convocar a San Juan del Estado y la comunidad de San Miguel Aloapam, a una mesa de diálogo a fin de solucionar la problemática planteada, para ello, esta Asamblea Regional, respalda a la comunidad de San Miguel Aloapam, e invita a la comunidad de San Juan del Estado, para que brinde las facilidades a fin de que se termine la construcción de su camino en tiempo y forma.-----

Quinto.- Revisar la posibilidad de incrementar el presupuesto asignado por kilometro de pavimentación, debido al alza de precios de los insumos y de la mano de obra.-----

PRESIDENCIA MUNICIPAL
Mpio. Nueva Zoquiapam,
Dtto. Ixtlán de Juárez,
Oax. 2020-2022

PRESIDENCIA MUNICIPAL
Mpio. Santa María Temascalapa,
Dtto. Villa Alta, Oax.
2020-2022

PRESIDENCIA MUNICIPAL
Mpio. Santa Ana Yaneri,
Dtto. Ixtlán, Oax.
2020-2022

PRESIDENCIA MUNICIPAL
Mpio. San Miguel Yotao,
Dtto. Ixtlán, Oax.
2020-2022

PRESIDENCIA MUNICIPAL
Mpio. San Juan Yalahui,
Dtto. Ixtlán, Oax.
2021-2022

PRESIDENCIA MUNICIPAL
Mpio. Santa Catarina Lachatao,
Dtto. Ixtlán, Oax.
2021-2022


PRESIDENCIA MUNICIPAL
Mpio. Santo Domingo Roayaga,
Dtto. Villa Alta, Oax.
2020-2022

PRESIDENCIA MUNICIPAL
Mpio. Santiago Camotlán,
Dtto. Villa Alta, Oax.
2020-2022

PRESIDENCIA MUNICIPAL
Mpio. San Juan Yaeé,
Dtto. Villa Alta, Oax.
2020-2022

PRESIDENCIA MUNICIPAL
Mpio. Santa María Yavesía,
Dtto. Ixtlán, Oax.
2020-2022

PRESIDENCIA MUNICIPAL
Mpio. San Pedro Yaneri,
Dtto. Ixtlán de Juárez,
Oax. 2021-2022

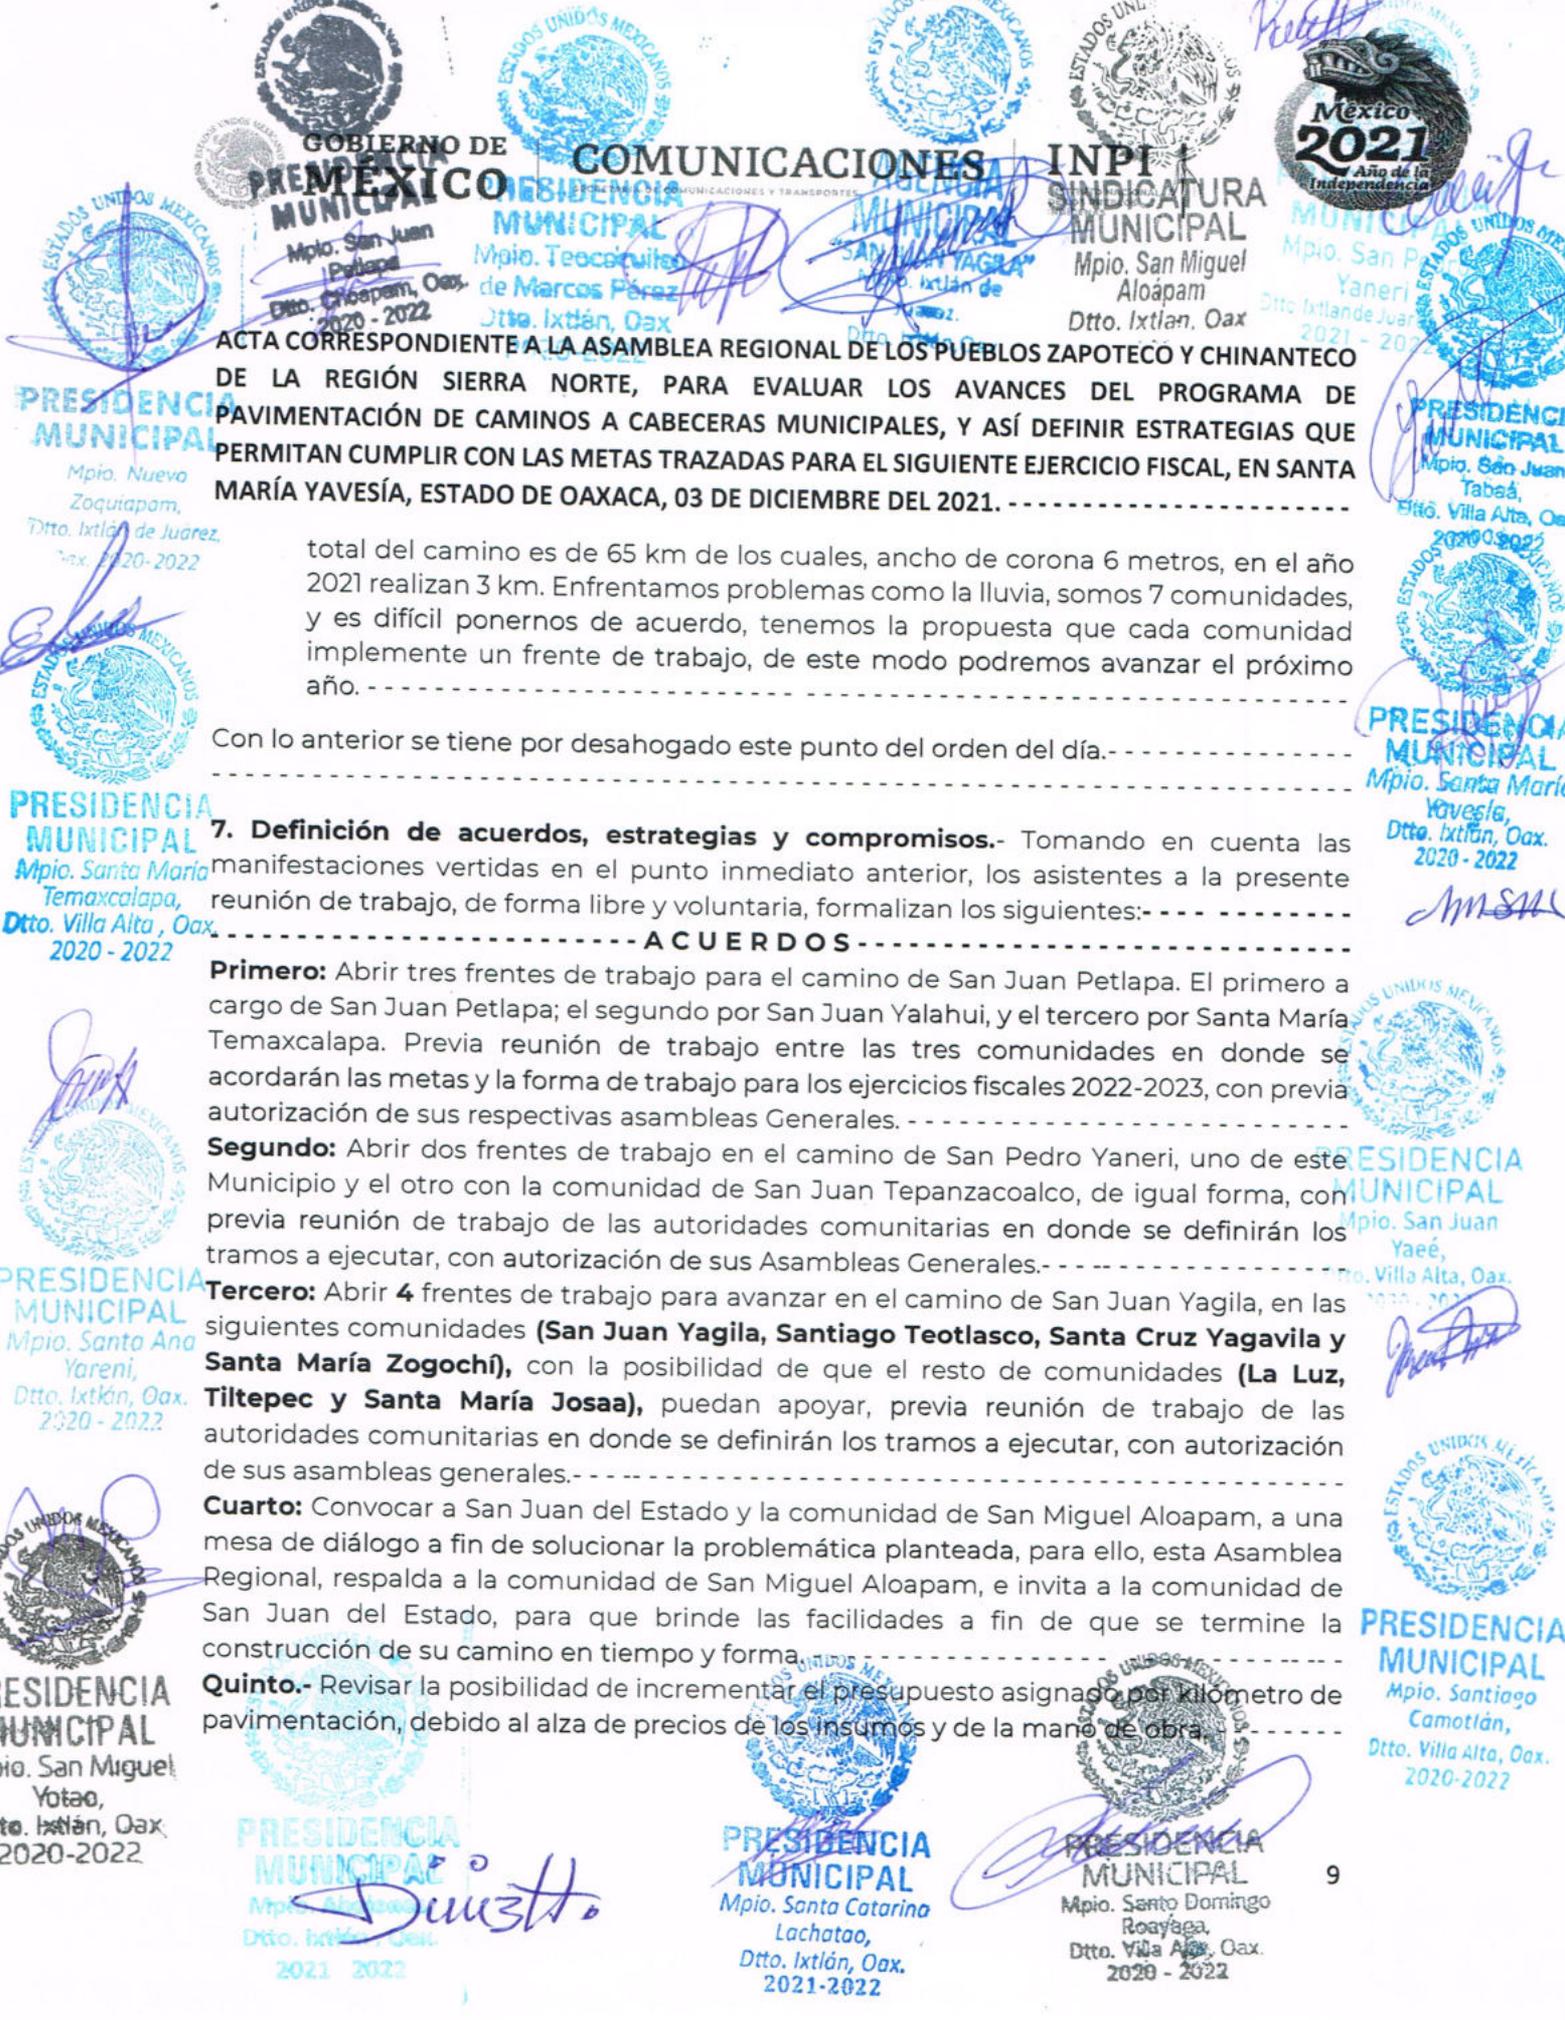

COMUNICACIONES INPI

ACTA CORRESPONDIENTE A LA ASAMBLEA REGIONAL DE LOS PUEBLOS ZAPOTECO Y CHINANTECO DE LA REGIÓN SIERRA NORTE, PARA EVALUAR LOS AVANCES DEL PROGRAMA DE PAVIMENTACIÓN DE CAMINOS A CABECERAS MUNICIPALES, Y ASÍ DEFINIR ESTRATEGIAS QUE PERMITAN CUMPLIR CON LAS METAS TRAZADAS PARA EL SIGUIENTE EJERCICIO FISCAL, EN SANTA MARÍA YAVESÍA, ESTADO DE OAXACA, 03 DE DICIEMBRE DEL 2021.

Sexto: Dialogar con la Secretaria General de Gobierno de nuestro Estado, para agilizar el proceso de acreditación de las Autoridades Municipales.

Séptimo: Generar diálogo entre el INPI, SCT y la SHCP, a fin de agilizar la ministración de los recursos y la firma de convenios en tiempo y forma, las Autoridades Municipales entregarán su documentación debidamente integrada.

Octavo: Reunirnos nuevamente en el mes de febrero del próximo año, para continuar evaluando avances y definir estrategias para alcanzar las metas.

8.- Firma del acta de acuerdos.

En virtud de lo anterior, habiéndose desahogado la totalidad de los puntos de la agenda del día, se procede a formalizar la presente acta para dejar constancia de los acuerdos alcanzados. Procediendo a firmar la misma.

9.- Clausura de la Asamblea por el C. Leandro Santiago Martínez.

En uso de la palabra, El C. Leandro Santiago Martínez, informa a los asistentes que no existe otro asunto que tratar, razón por la cual, declara formalmente clausurada la presente Asamblea, siendo las diecinueve horas con treinta minutos del día 03 de diciembre del año 2021.

POR LAS AUTORIDADES MUNICIPALES

C. Juan Pérez Moráles
Presidente Municipal de Santiago Camotlán

C. Blandino López Cano
Presidente Municipal de Santa Catarina Lachatao

C. Eusebio Morales Cano
Presidente Municipal de Santa María Temascalapa

C. David Honorio Santiago Cruz
Presidente Municipal de Santa María Yavesía



ACTA CORRESPONDIENTE A LA ASAMBLEA REGIONAL DE LOS PUEBLOS ZAPOTECO Y CHINANTECO DE LA REGIÓN SIERRA NORTE, PARA EVALUAR LOS AVANCES DEL PROGRAMA DE PAVIMENTACIÓN DE CAMINOS A CABECERAS MUNICIPALES, Y ASÍ DEFINIR ESTRATEGIAS QUE PERMITAN CUMPLIR CON LAS METAS TRAZADAS PARA EL SIGUIENTE EJERCICIO FISCAL, EN SANTA MARÍA YAVESÍA, ESTADO DE OAXACA, 03 DE DICIEMBRE DEL 2021.

C. Alejo Alfredo Sosa Hernández

Presidente Municipal de San Juan Yaeé

C. Leonardo Víctor Martínez Morales

Presidente Municipal de Santo Domingo Roayaga

C. Alfonso Tomas Pérez Ramírez

Presidente Municipal de Teocoquilco de Marcos Pérez

C. Ángel León Alavéz

Presidente Municipal de Nuevo Zoquiápam

C. Juan Pedro Cruz Hernández

Presidente Municipal de Santa Ana Yareni

C. Diego Cruz Bautista

Presidente Municipal de Abejones

C. Pánfilo Mendoza Mendoza

Presidente Municipal de San Miguel Yotao

C. Roberto Alavéz Hernández

Síndico Municipal de San Miguel Aloápam

C. Joaquín Pura Estrada

Presidente Municipal de San Juan Tlapala

C. Guillermo Ermitaño Pérez Prudencio

Presidente Municipal de San Pedro Yaneri

C. Juan Miguel Fabián

Presidente Municipal de San Juan Tabaá

C. Silvano Francisco Reyes

Agente Municipal de San Juan Yagila

C. Juan Pérez Morales

Presidente Municipal de Santiago Camotlán

C. Blandino López Cano

Presidente Municipal de Santa Catarina Lachatao



ACTA CORRESPONDIENTE A LA ASAMBLEA REGIONAL DE LOS PUEBLOS ZAPOTECO Y CHINANTECO DE LA REGIÓN SIERRA NORTE, PARA EVALUAR LOS AVANCES DEL PROGRAMA DE PAVIMENTACIÓN DE CAMINOS A CABECERAS MUNICIPALES, Y ASÍ DEFINIR ESTRATEGIAS QUE PERMITAN CUMPLIR CON LAS METAS TRAZADAS PARA EL SIGUIENTE EJERCICIO FISCAL, EN SANTA MARÍA YAVESÍA, ESTADO DE OAXACA, 03 DE DICIEMBRE DEL 2021.

C. Eusebio Morales Cano
Presidente Municipal de Santa María Temascalapa

C. David Honorio Santiago Cruz
Presidente Municipal de Santa María Yavesía

C. Alejo Alfredo Sosa Hernández
Presidente Municipal de San Juan Yaeé

C. Leonardo Víctor Martínez Morales
Presidente Municipal de Santo Domingo Roayaga

C. Alfonso Tomas Pérez Ramírez
Presidente Municipal de Teococuilco de Marcos Pérez
Dpto. Ixtlán, Oax. 2020-2022

C. Ángel León Alavéz
Presidente Municipal de Nuevo Zoquiápam

C. Juan Pedro Cruz Hernández
Presidente Municipal de Santa Ana Yareni

C. Diego Cruz Bautista
Presidente Municipal de Abejones

C. Pánfilo Mendoza Mendoza
Presidente Municipal de San Miguel Yotao
Dpto. Ixtlán, Oax. 2020-2022.

C. Roberto Alavéz Hernández
Síndico Municipal de San Miguel Aloápam
Dpto. Ixtlán, Oax.

C. Joaquín Pura Estrada
Presidente Municipal de San Juan Petlapa
Dpto. Choapam, Oax. 2020 - 2022

C. Guillermo Ermitaño Pérez Prudencio
Presidente Municipal de San Pedro Yareni

Mpio. San Pedro Yareni
Dpto. Ixtlan de Juárez, Oax. 2021 - 2022



ACTA CORRESPONDIENTE A LA ASAMBLEA REGIONAL DE LOS PUEBLOS ZAPOTECO Y CHINANTECO DE LA REGIÓN SIERRA NORTE, PARA EVALUAR LOS AVANCES DEL PROGRAMA DE PAVIMENTACIÓN DE CAMINOS A CABECERAS MUNICIPALES, Y ASÍ DEFINIR ESTRATEGIAS QUE PERMITAN CUMPLIR CON LAS METAS TRAZADAS PARA EL SIGUIENTE EJERCICIO FISCAL, EN SANTA MARÍA YAVESÍA, ESTADO DE OAXACA, 03 DE DICIEMBRE DEL 2021. -----

C. Juan Miguel Fabián
Presidente Municipal de San Jua Tabaá

C. Silvano Francisco Reyes
Agente Municipal de San Juan Yagila,
Ixtlán de Juárez
Mpio. Ixtlán de Juárez.
Dtto. Ixtlán, Oax.

POR LA SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

Arq. José Daniel Ángeles Ramírez
Coordinador del programa de Pavimentación
de Caminos a Cabeceras Municipales del Centro SCT Oaxaca

Ing. Saraí Barroso Bravo
Residente de la SCT, en Ixtlán de Juárez, Oaxaca

POR EL INSTITUTO NACIONAL DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS

Lic. Adelfo Regino Montes
Director General del INPI

Arq. Hugolino Mendoza Sánchez
Coordinador General de Infraestructura
Indígena

Lic. Jerónimo López Marín
Titular de la Oficina de Representación
del INPI en Oaxaca

Lic. Cuauhtémoc Faustino Reyes
Titular del Centro Coordinador del
INPI en Guelatao de Juárez
